

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI CIVIDALE

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto dei lavori

RISTRUTTURAZIONE GENERALE CON AMPLIAMENTO PER  
IL COMPLETO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO

BAGNI ASSISTITI

Fase del progetto

ESECUTIVO

Committente



AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA  
"CASA PER ANZIANI" – CIVIDALE DEL FRIULI

Titolo del documento

CRONOPROGRAMMA

Progettista incaricato: ing. Lucio Asquini

Archest

Sede di Palmanova (Ud) Via Giustinian, 31 - 33057  
Sede di Pozzuolo del Friuli (Ud) Via Sclaunico, 7 - 33050  
p. IVA 02449990304  
t: 0432.665.335 f: 0432.665299  
e: info@archest.it w: www.archest.it




epsilon



Progettazione impianti e prevenzione incendi

via Roma, 15 - 33058 - San Giorgio di Nogaro (Ud)  
c.f./p.IVA 02257820304  
t: 0431.66549 - 0431.621407 f: 0431.629621

Rev.	Data	Descrizione	Compilato
00	Maggio 2013	Prima emissione	
01	Ottobre 2013	Aggiornamento numero progressivo elaborato	P.R.
1	0	0	2 d - P E - D O C 0 1 7

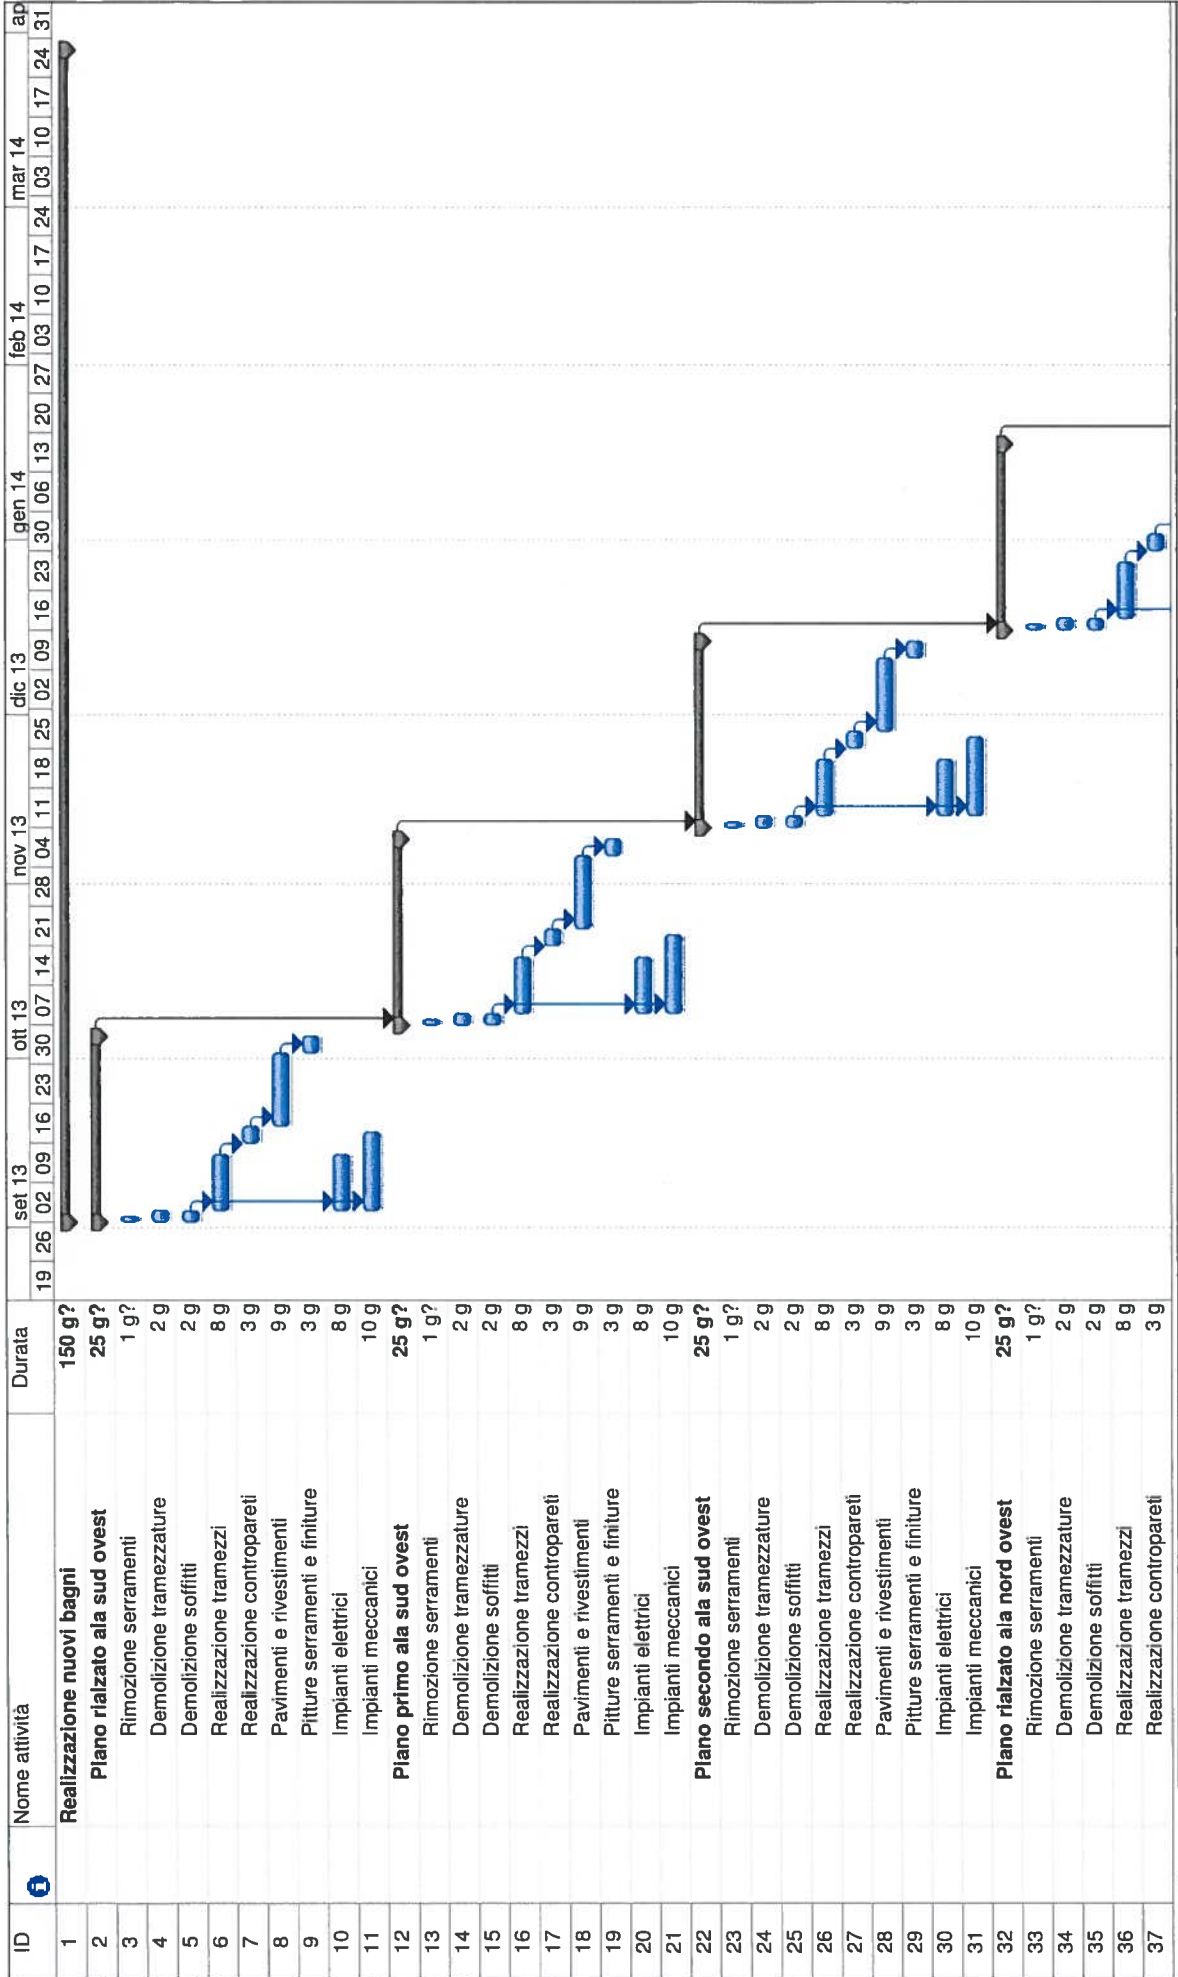

ID	Nome attività	Durata
1	<b>Realizzazione nuovi bagni</b>	<b>150 g?</b>
2	<b>Piano rialzato ala sud ovest</b>	<b>25 g?</b>
3	Rimozione serramenti	1 g?
4	Demolizione tramezzature	2 g
5	Demolizione soffitti	2 g
6	Realizzazione tramezzi	8 g
7	Realizzazione contropareti	3 g
8	Pavimenti e rivestimenti	9 g
9	Pitture serramenti e finiture	3 g
10	Impianti elettrici	8 g
11	Impianti meccanici	10 g
12	<b>Piano primo ala sud ovest</b>	<b>25 g?</b>
13	Rimozione serramenti	1 g?
14	Demolizione tramezzature	2 g
15	Demolizione soffitti	2 g
16	Realizzazione tramezzi	8 g
17	Realizzazione contropareti	3 g
18	Pavimenti e rivestimenti	9 g
19	Pitture serramenti e finiture	3 g
20	Impianti elettrici	8 g
21	Impianti meccanici	10 g
22	<b>Piano secondo ala sud ovest</b>	<b>25 g?</b>
23	Rimozione serramenti	1 g?
24	Demolizione tramezzature	2 g
25	Demolizione soffitti	2 g
26	Realizzazione tramezzi	8 g
27	Realizzazione contropareti	3 g
28	Pavimenti e rivestimenti	9 g
29	Pitture serramenti e finiture	3 g
30	Impianti elettrici	8 g
31	Impianti meccanici	10 g
32	<b>Piano rialzato ala nord ovest</b>	<b>25 g?</b>
33	Rimozione serramenti	1 g?
34	Demolizione tramezzature	2 g
35	Demolizione soffitti	2 g
36	Realizzazione tramezzi	8 g
37	Realizzazione contropareti	3 g

Progetto: Cronoprogramma.mpp  
 Data: sab 29/06/13

Attività esterne  
 Cardine esterno  
 Scadenza

Cardine  
 Riepilogo  
 Riepilogo progetto

Attività  
 Divisione  
 Avanzamento

Pagina 1

ID	Nome attività	Durata	set 13			ott 13			nov 13			dic 13			gen 14			feb 14			mar 14			ap				
			19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06		13	20	27	03
38	Pavimenti e rivestimenti	9 g																										
39	Pitture serramenti e finiture	3 g																										
40	Impianti elettrici	8 g																										
41	Impianti meccanici	10 g																										
42	<b>Plano primo ala sud ovest</b>	<b>25 g?</b>																										
43	Rimozione serramenti	1 g?																										
44	Demolizione tramezzature	2 g																										
45	Demolizione soffitti	2 g																										
46	Realizzazione tramezzi	8 g																										
47	Realizzazione contropareti	3 g																										
48	Pavimenti e rivestimenti	9 g																										
49	Pitture serramenti e finiture	3 g																										
50	Impianti elettrici	8 g																										
51	Impianti meccanici	10 g																										
52	<b>Plano secondo ala sud ovest</b>	<b>25 g?</b>																										
53	Rimozione serramenti	1 g?																										
54	Demolizione tramezzature	2 g																										
55	Demolizione soffitti	2 g																										
56	Realizzazione tramezzi	8 g																										
57	Realizzazione contropareti	3 g																										
58	Pavimenti e rivestimenti	9 g																										
59	Pitture serramenti e finiture	3 g																										
60	Impianti elettrici	8 g																										
61	Impianti meccanici	10 g																										



Attività esterne  
Cardine esterno  
Scadenza



Cardine  
Riepilogo  
Riepilogo progetto



Attività  
Divisione  
Avanzamento

Progetto: Cronoprogramma.mpp  
Data: sab 29/06/13
